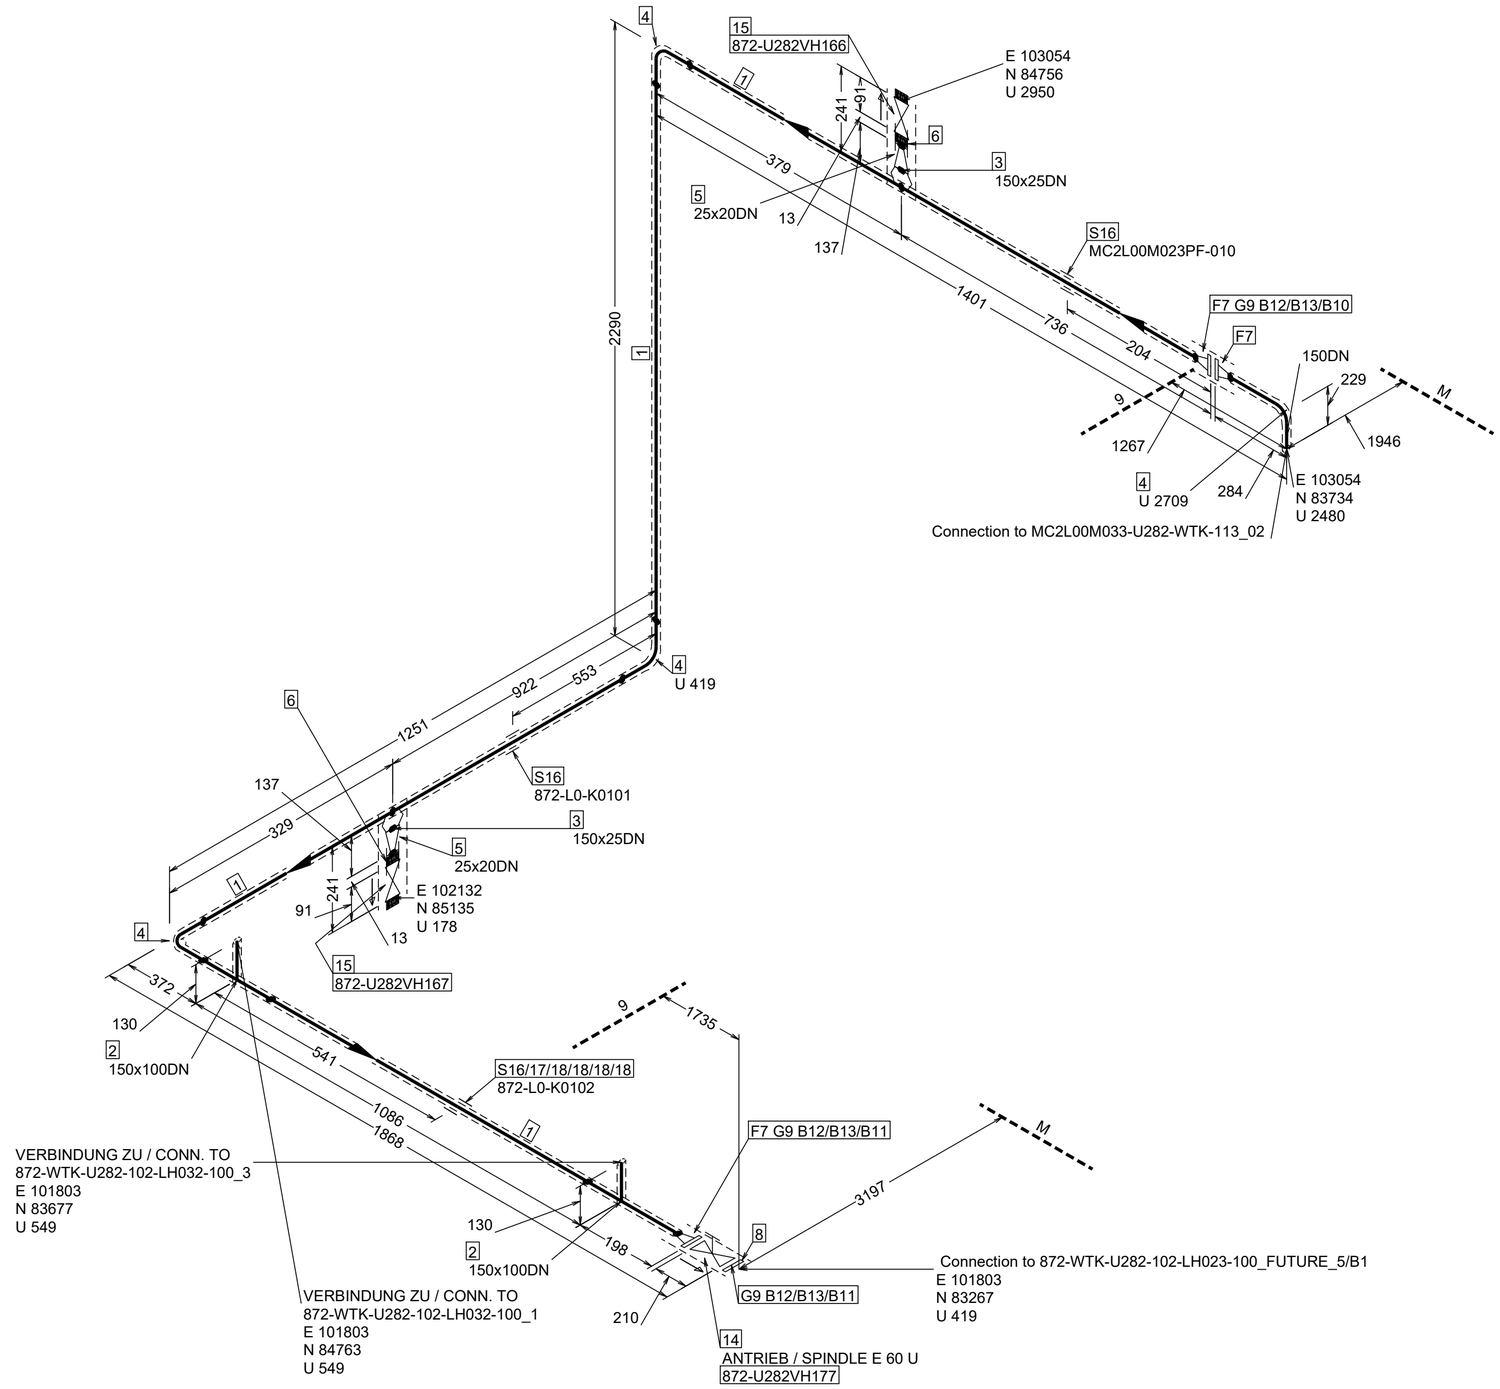

FERTIGUNGSMATERIALIEN / FABRICATION MATERIALS

NR NO	BAUTEIL / COMPONENT	CODE	DN	ANZ. / QTY
1	TUBE ACCORDING TO DIN EN ISO 1127 ROW 1 1.4404	LH032/100HB	150	4256
2	TEE ACCORDING TO DIN EN 10253-4 TYPE A 1.4404	LH032/156HB	150 x 100	2
3	PIPE COLAR 1.4404	LH032/163HB	150 x 25	2
4	ELBOW 90° 3D ACCORDING TO DIN EN 10253-4 TYPE A 1.4404	LH032/110HB	150	4
5	REDUCER CONCENTRIC ACCORDING TO DIN EN 10253-4 1.4404	LH032/135HB	25 x 20	2
6	SCHWER FITTINGS WELDING NIPPLE GF-100R3430-7	LH032/SP034	20	2
7	FLANGE ACCORDING TO DIN EN ISO 1092-1 PN10 FORM B TYPE 11 1.4404	LH032/200HB3	150	3
8	BLINDFLANGE ACCORDING TO DIN EN ISO 1092-1 PN10 FORM B TYPE 05 1.4404	LH032/230HB3	150	1

MONTAGEMATERIALIEN / ERECTION MATERIALS

NR NO	BAUTEIL / COMPONENT	CODE	DN	ANZ. / QTY
9	GASKET ACCORDING TO DIN EN 1514-1, FORM IBC, PN10, THICKNESS 1,5MM PTFE	LH032/270TG	150	3
10	MACHINE BOLT ACCORDING TO DIN EN ISO 4017 M20 x80	LH032-Bolting/M	20	8
11	MACHINE BOLT ACCORDING TO DIN EN ISO 4017 M20 x50	LH032-Bolting/M	20	16
12	NUT ACCORDING TO DIN EN ISO 4032 M20	LH032-Bolting/N	20	24
13	WASHER ACCORDING TO DIN EN ISO 7090 M20	LH032-Bolting/W	20	24
14	GATE VALVE WITH SOFT SEAL PN16 WITH FLANGE ON BOTH SIDES	LH032/1be	150	1
15	BOILER BALL VALVE, CONNECTION RP FEMALE THREAD	LH032/KV26001.x	20	2
16	Sliding Support LC-HV 90 163-169 (DN 150) HCP (110070)	SIK/CAT/LcHcpHv	150	3
	MISCELLANEOUS COMPONENTS			
17	Guided Bracket FW F100 (113088)	SIK/CAT/FwF100	150	1
18	Self Forming Screw FLS F (192512)	SIK/CAT/Fls	150	4

N U E W D S

Y Z X -X -Z -Y

Nr. No.	Schweißdatum Welding Date	Schweißer/Art Welder/Type	Prüfdatum Check Date	Prüfart/Befund Testtype/Finding	Prüfer Checker	Nr. No.	Schweißdatum Welding Date	Schweißer/Art Welder/Type	Prüfdatum Check Date	Prüfart/Befund Testtype/Finding	Prüfer Checker

geprüft: checked:

☐ OK
☐ mit Vermerk with Remark
☐ keine Freigabe no Release

Rev.	Datum/Date	gez./drawn	gepr./checked	Bemerkung/Comment
01.00	28.08.2023	Rosu	Stuntner	First issue

Alle angeführten Maße sind theoretische Werte. Die Montagefirma hat vor Montage bzw. Vorfertigung Naturmaße zu nehmen bzw, die Einbaulängen der Komponenten zu prüfen und Montagenähte vorzusehen.
All shown measures are theoretical values. Before the start of installation or prefabrication the installation company has to check the acutal dimensions and fitting lengths of the components and has to plan any erection seams.

Auftraggeber/Client	Lonza AG	R+I/PID	LV1-104874.282
Projekt/Project	Orca	Rohrleitungsnr./Line no.	872-WTK-U282-102-LH032-150_1
	Datum/Date: 28.08.23	Name: Rosu	
gez./drawn	28.08.23	Rosu	
gepr./checked	28.08.23	Stuntner	

A2 — Zeichnungsnr./Drawing no.: 872-WTK-U282-102-LH032-150_1-0_REV01.00.pdf

Baubschnitt/Area: UV Filters
Isolierung/Insulation: T60-Insu
Seite/Page: 1 /1
Revision: 01.00

VTU design solutions

Copyright by VTU Design Solutions GmbH.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie der Übersetzung vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie oder ähnliches) ohne schriftliche Genehmigung von VTU Design Solutions GmbH
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Copyright by VTU Design Solutions GmbH.
All rights, in particular the right of reproduction and distribution, as well as the Translation reserved.
No part of the work may be in any form (by photocopy or similar) or stored, reproduced or distributed
reproduced or using electronic systems, multiplied or spread.
